

RESTAURATION HÔTEL DE VILLE INFORMATIONS CHANTIER



Pôle Cadre de Vie - Service Bâtiments
Pôle Stratégie & Attractivité - Service Communication





PHASE I

AILE ADMINISTRATIVE - PLACE DES CARMES




PHASE I

**du 2 au 20 juin
en 2 temps :**

- 1. Installation des échafaudages**
- 2. Montage de la toiture parapluie**

1. Installation des échafaudages devant les façades

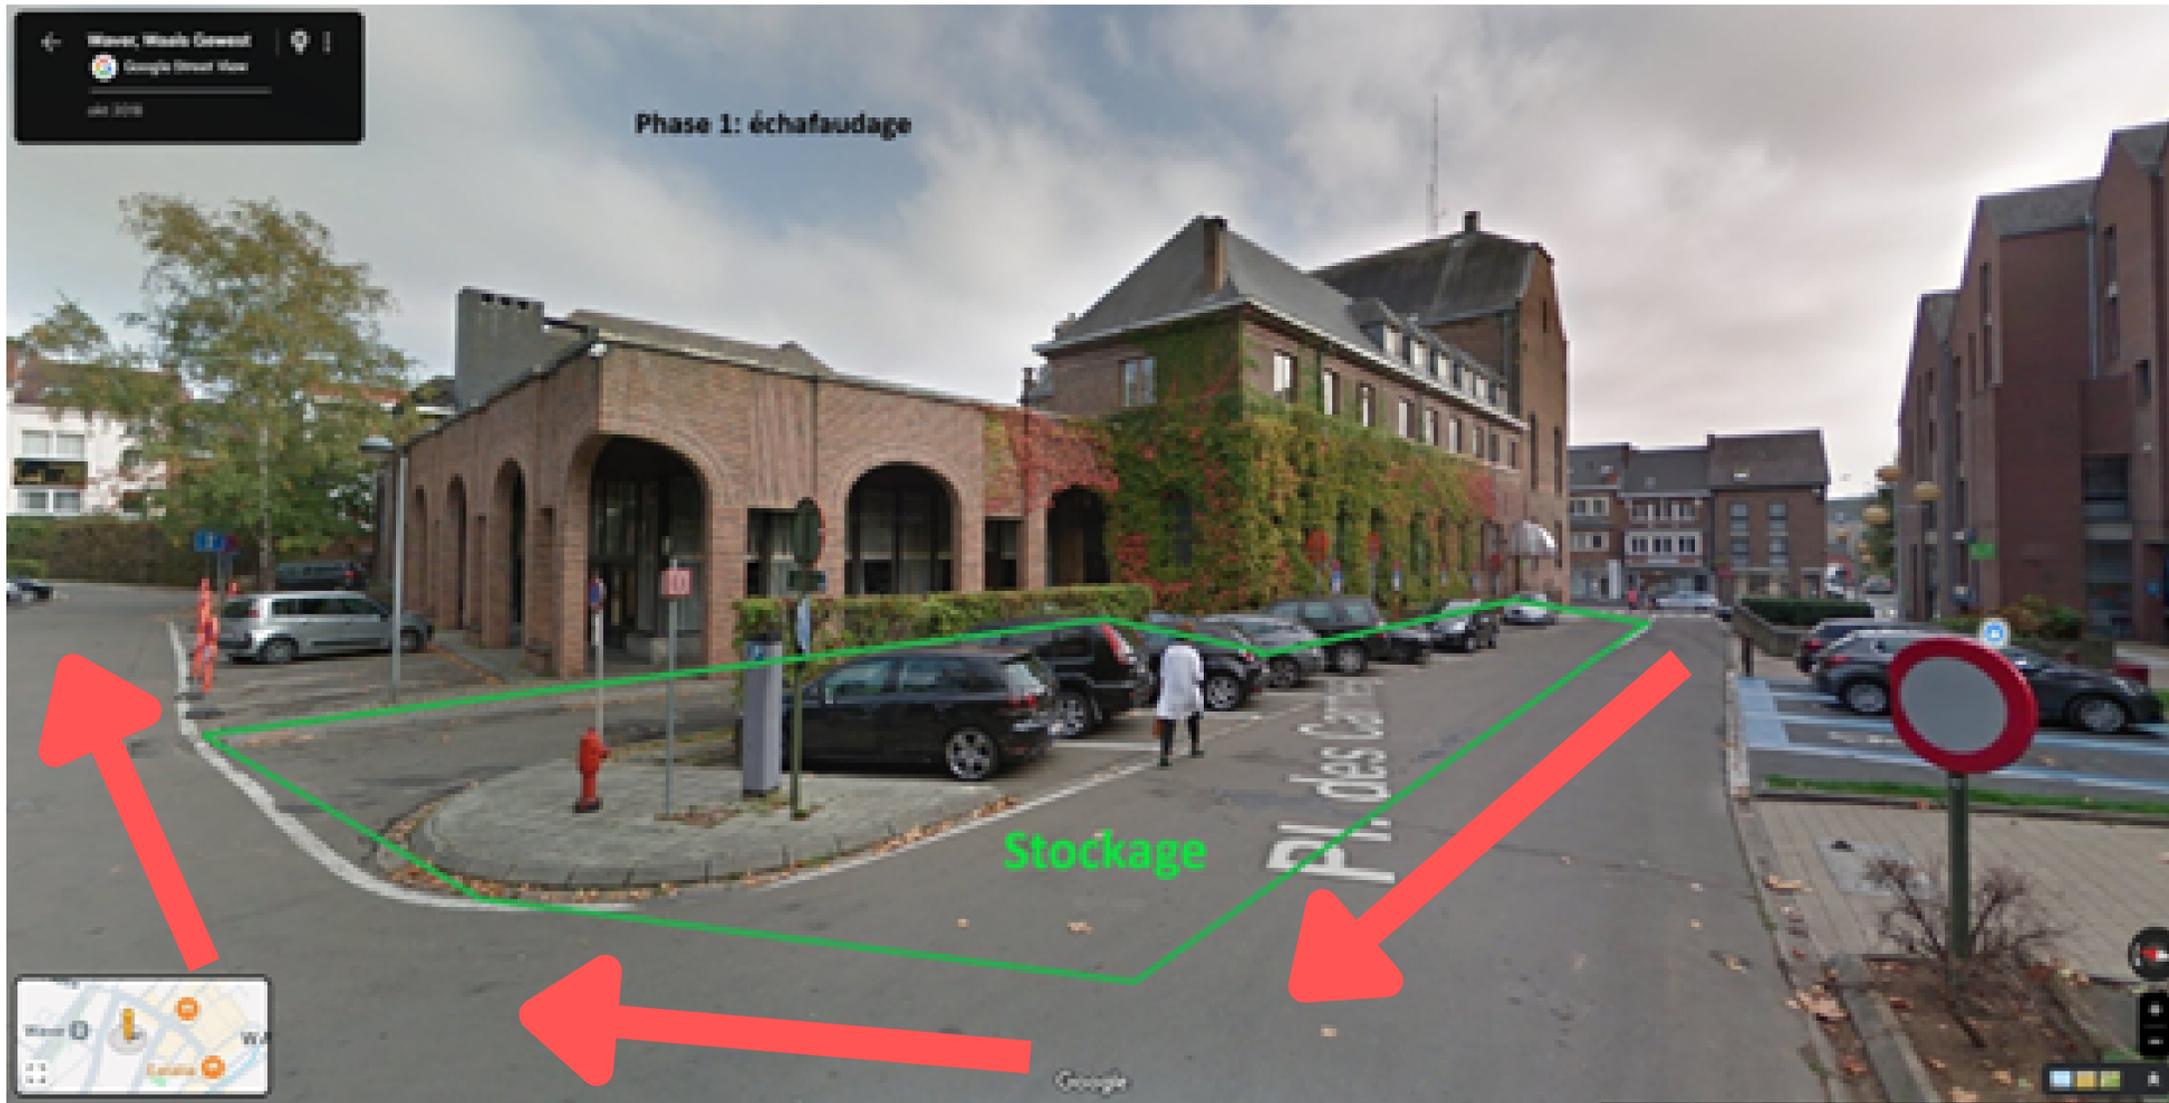


Phase I - 1

Du 2 au 11 juin

planning hors intempéries

Circulation sens unique
Stockage partiel sur
parking

2. Montage de la toiture parapluie

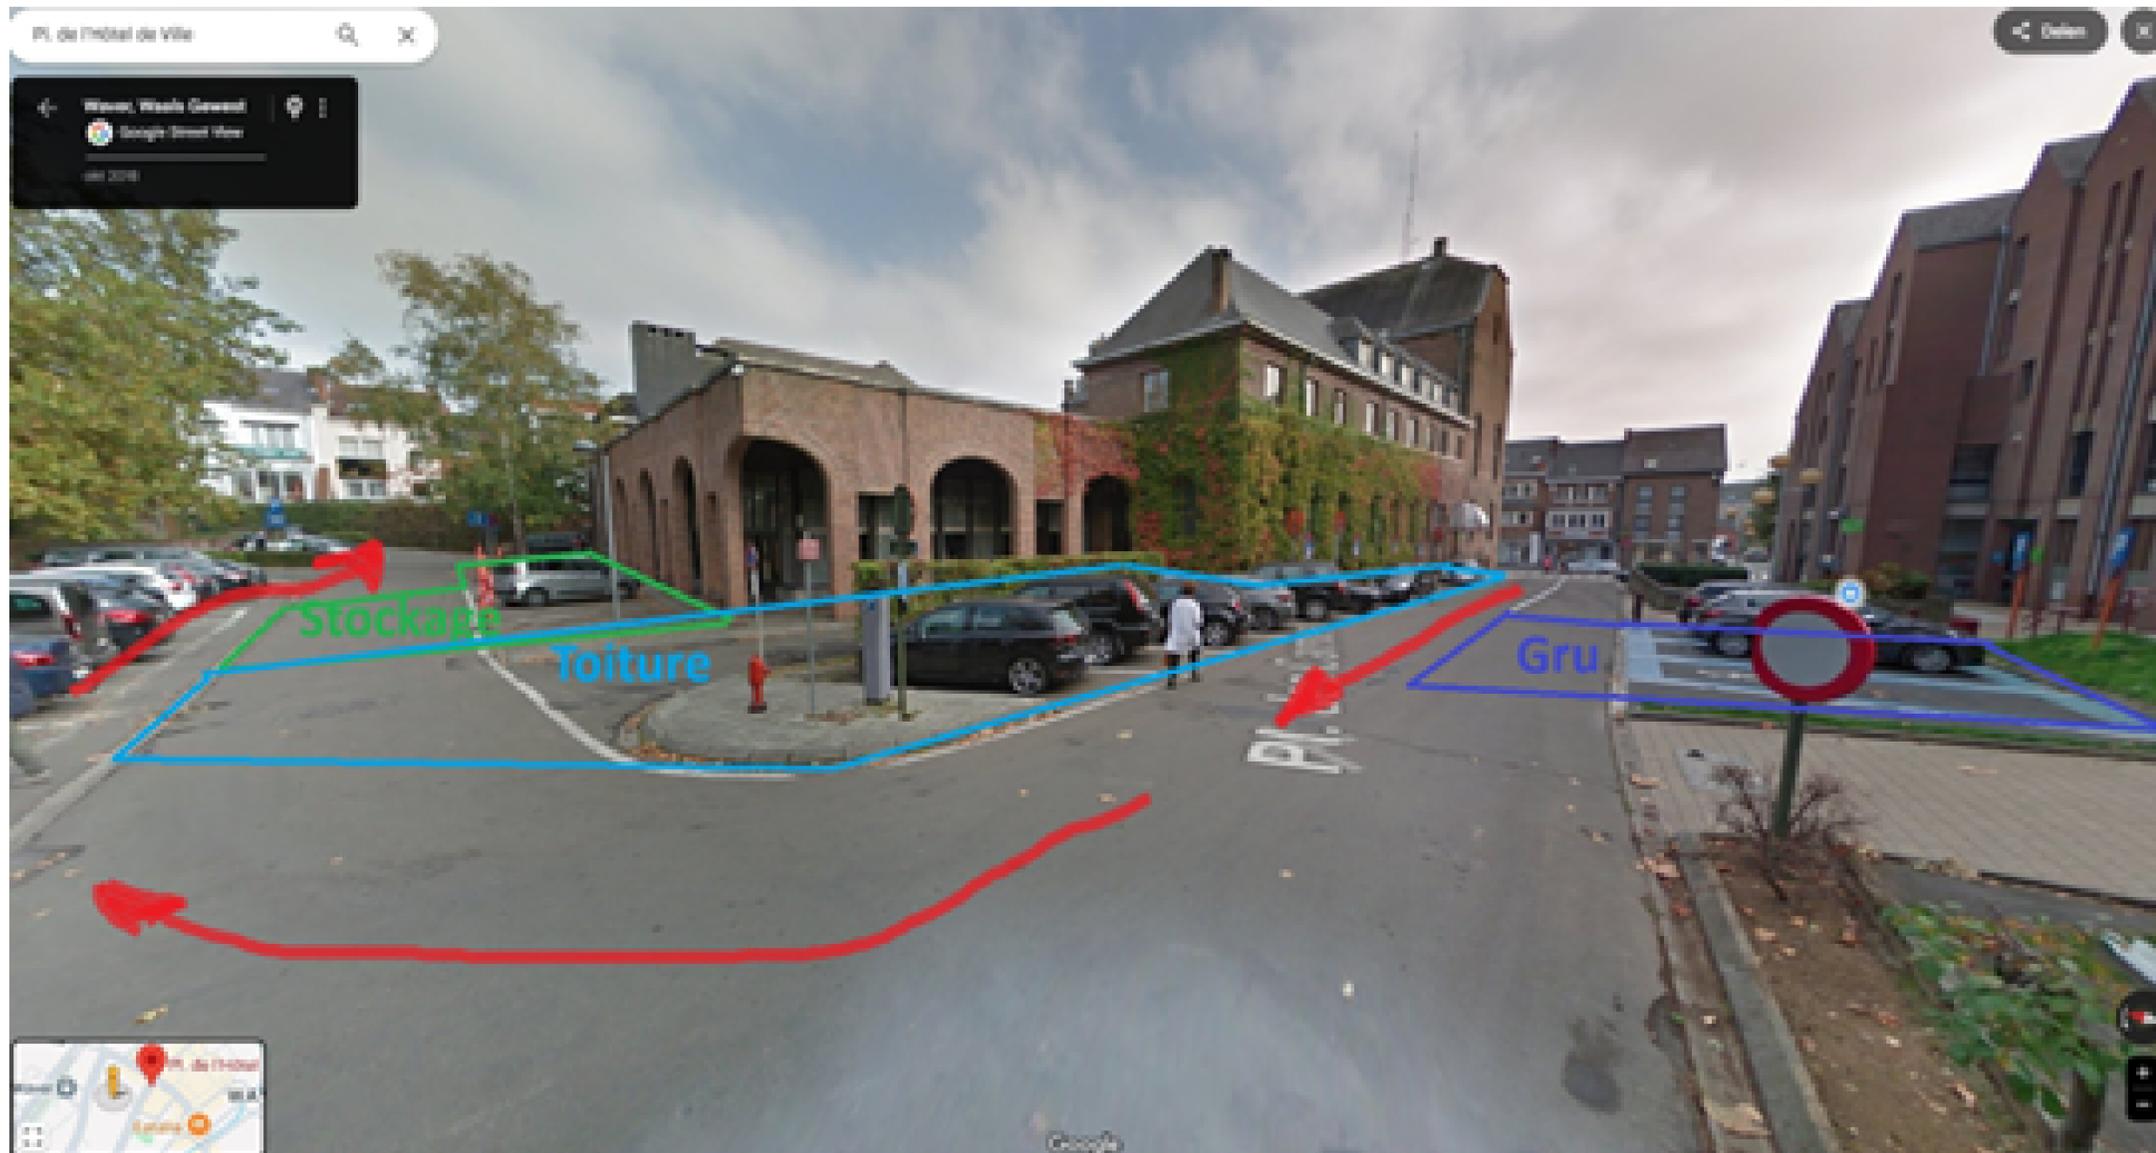

Phase I - 2

Du 12 au 20 juin

planning hors intempéries

- Objectif : braderie
- Construction toiture au sol + grue
- PMR - rue de Nivelles
- Circulation sens unique
- Suppression parking pour circulation et stockage

PHASE I

AILE ADMINISTRATIVE - PLACE DES CARMES

